



Excmo. Ayuntamiento de Huelva.

***RESUMEN TRABAJOS
EJECUTADOS
EN VÍA PÚBLICA.***

AGOSTO 2016.



COD OBRA	LOCALIZACION OBRA	DETALLE OBRA	FECHA INC	FECHA FIN	PETICIONARIO	IMPORTE
05486	PLAZA DON MIGUEL Nº2	REPARAR HUNDIMIENTO EN ACERADO	10/06/2016	23/08/2016	SEBASTIAN	627,93 €
05607	PLAZA DE LA GRANAINA	REPASO GENERAL DE PLAZA	20/07/2016	05/08/2016	ROMAN	948,95 €
05613	C/ TESORO DE ALISEDA	REPARACION DE ENTRADA A GARAJE CON ADOQUINES	25/07/2016	01/08/2016	ROMAN	2.399,11 €
05616	C/ RUBEN DARIO ESQ. C/ DIAZ DEL CASTILLO	NUOVA PAVIMENTACION DE TRAMO DE ACERADO EN MAL ESTADO	26/07/2016	09/08/2016	JENARO	4.351,41 €
05617	PARQUE FRANCISCO JIMENEZ	REPARACION DE ACERADO DE PARQUE EN MAL ESTADO	27/07/2016	09/08/2016	SEBASTIAN	2.918,07 €
05619	AYUNTAMIENTO	TRABAJOS DE PINTURA	28/07/2016	04/08/2016	ROMAN	875,92 €
05622	AVDA. ADORATRICES (DE C/ VILLAMUNDAKA AL Nº54)	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	29/07/2016	01/08/2016	SEBASTIAN	366,00 €
05623	C/ VILLAMUNDAKA	TAPARA AGUJEROS EN ACERADO DE CANALIZACIONES PROVISIONALES	01/08/2016	01/08/2016	SEBASTIAN	20,25 €
05624	C/ CANARIAS Nº1-3	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	01/08/2016	02/08/2016	SEBASTIAN	167,24 €
05625	PLAZA JORGE JUAN	REPADO DE PLAZA EN GENERAL	01/08/2016	19/08/2016	ROSA	4.589,07 €
05626	ASFALTO MES DE AGOSTO	PARCHEOS DE ASFALTO EN FRIO	01/08/2016	26/08/2016	ROSA	6.538,42 €
05627	C/ JABUGO Nº8	REPARAR HUNDIMIENTO EN ACERADO PROVOCANDO HUMEDAD EN VIVIENDA	01/08/2016	05/08/2016	ROMAN	1.260,65 €
05628	PLAZA DE LA CAÑA	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	02/08/2016	10/08/2016	ROMAN	1.853,91 €
05629	AVDA. MUÑOZ DE VARGAS (FRENTE BAR PUEBLO)	REPARAR BALDOSA EN MAL ESTADO	02/08/2016	02/08/2016	ROMAN	39,75 €
05630	C/ BALEARES	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO JUNTO CONTENEDORES	02/08/2016	02/08/2016	SEBASTIAN	210,08 €
05631	C/ PUNTAUMBRIA Nº2	COLOCACION DE PILONAS DE TUBO	04/08/2016	04/08/2016	SEBASTIAN	145,48 €
05632	C/ ROQUE BARCIA (ENTRADA LATERAL BARRIO OBRERO)	REPOSICION DE PILONAS EXTRAIBLES	04/08/2016	04/08/2016	SEBASTIAN	378,65 €
05633	C/ FRAY JUAN PEREZ	REPARAR ACERADO EN MAL ESTADO	04/08/2016	04/08/2016	SEBASTIAN	96,26 €
05634	AVDA. FEDERICO MOLINA (JUNTO KIOSKO CHURROS)	REPOSICION DE BALDOSA DE 9 TACOS GRIS	04/08/2016	04/08/2016	ROMAN	20,91 €


05635	AVDA. PUNTA UMBRIA (ENTRADA A PARQUE FRANCISCO JIMENEZ)	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	05/08/2016	05/08/2016	SEBASTIAN	269,17 €
05636	AVDA. FEDERICO MOLINA (PARADA BUS EL ARBOL)	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	05/08/2016	05/08/2016	ROMAN	75,45 €
05637	EDF. BOMBEROS	TRABAJOS DE PINTURA	05/08/2016	05/08/2016	ROMAN	282,80 €
05638	C/ ANTON DE ALAMINOS	REPARACION DE HUNDIMIENTO EN CALZADA DELANTE DE PUERTA DE GARAJE	05/08/2016	05/08/2016	SEBASTIAN	158,94 €
05639	AVDA. FUERZAS ARMADAS	REALIZACION DE NUEVA PAVIMENTACION	08/08/2016	29/08/2016	JENARO	6.918,56 €
05640	AVDA. GALAROZA	REPARAR HUNDIMIENTO EN ACERADO Y REPASO DE ESTE	08/08/2016	08/08/2016	ROMAN	647,27 €
05641	TRASERA C/ CONDADO	REPOSICION DE PILONAS DE TUBO	09/08/2016	09/08/2016	SEBASTIAN	258,28 €
05642	COLEGIO HISPANIDAD	DEMOLICION DE ACERADO PARA POSTERIOR HORMIGONADO	09/08/2016	12/08/2016	JENARO	2.224,54 €
05643	AVDA. DE LA RIA	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	10/08/2016	11/08/2016	SEBASTIAN	164,15 €
05644	AVDA. GALAROZA	ANULAR HUECO CONTENEDORES Y REPASO DE ACERADO	10/08/2016	11/08/2016	ROMAN	485,23 €
05645	TRASERA C/ ARTESANOS	REPARACION DE CALZADA VIA DE SERVICIO EN MAL ESTADO	10/08/2016	18/08/2016	JENARO	2.836,34 €
05646	C/ LENTISCO	REPARACION DE ADOQUINES SUELTOS JUNTO ARQUETA	11/08/2016	11/08/2016	SEBASTIAN	100,88 €
05647	C/ MENDEZ NUÑEZ (PUERTA GERENCIA URBANISMO)	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	11/08/2016	11/08/2016	SEBASTIAN	93,38 €
05648	GLORIETA DE LOS FUNDIDORES	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	11/08/2016	11/08/2016	ROMAN	162,33 €
05649	C/ FENICIOS Nº19	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	12/08/2016	12/08/2016	ROMAN	327,10 €
05650	C/ DIEGO DE ALMAGRO	REPARACION DE JARDINERAS EN MAL ESTADO Y REPASO DE ACERADO	12/08/2016	25/08/2016	SEBASTIAN	2.802,04 €
05651	MUELLE DEL TINTO	COLOCACION DE TABLEROS DE PANEL MARINO EN HUECOS CON FALTA DE MATERIAL	16/08/2016	17/08/2016	ROMAN	685,94 €
05652	AVDA. MANUEL SIUROT	CLAUSURAR MIRADOR DEL CONQUERO EN MAL ESTADO PELIGROSO	16/08/2016	19/08/2016	ROSA	1.534,58 €


05653	C/ PINTOR PEDRO GOMEZ	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	16/08/2016	16/08/2016	ROSA	166,38 €
05654	PLAZA CRISTO DEL PERDON	REPARAR ALCORQUE EN MAL ESTADO	16/08/2016	17/08/2016	ROMAN	454,78 €
05655	PLAZA EUGENIO HERMOSO	COLOCACION DE ANCLAJES PASA VARANDA	17/08/2016	18/08/2016	ROMAN	462,42 €
05656	GLORIETAS DE LOS MARINEROS	REPARACION DE ACERADO EN MAL ESTADO POR RAICES	18/08/2016	19/08/2016	ROMAN	395,31 €
05657	CEMENTERIO	REPOSICION DE PILONAS EXTRAIBLES	18/08/2016	18/08/2016	ROMAN	414,40 €
05658	AVDA. PABLO RADA	REPOSICION DE PILONA DE BOLA DE FUNDICION	18/08/2016	18/08/2016	ROMAN	126,27 €
05659	SANTUARIO DE LA CINTA	TAPAR AGUJERO EN RL INTERIOR DEL SANTUARIO	18/08/2016	18/08/2016	ROSA	45,40 €
05660	PLAZA HERMANOS CAPUCHINOS	SOLAR ALCORQUES CON ADOQUINES	18/08/2016	19/08/2016	ROMAN	156,71 €
05661	C/ SANSON CARRASCO	REPARACION DE ACERADO JUNTO ARQUETA	19/08/2016	19/08/2016	ROMAN	49,97 €
05662	ESTADIO NUEVO COLOMBINO	RECOLOCACION DE PILONA DE SUELTA	19/08/2016	19/08/2016	ROSA	42,00 €
05663	C/ MARINA	REPOSICION DE ADOQUINES EN ACERADO	19/08/2016	19/08/2016	ROMAN	39,00 €
05664	TALLISTA MIGUEL HIERRO BARREDA	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	19/08/2016	22/08/2016	ROMAN	276,67 €
05665	AVDA. DE LA CINTA Nº60	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE JARDINERAS	19/08/2016		ROSA	2.960,09 €
05666	AVDA. ALEMANIA Nº71	REPARACION DE ACERADO HUNDIDO HACIA FACHADA	22/08/2016	25/08/2016	SEBASTIAN	1.741,56 €
05667	AVDA. FEDERICO MOLINA (PUESTO INFOM. TURISMO)	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	22/08/2016	24/08/2016	ROMAN	916,66 €
05668	AVDA. CRISTOBAL COLON (TRAMO BRDA. EL CARMEN)	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO Y REPOSICION DE TAPAMENTO DE MURO	22/08/2016	23/08/2016	ROSA	743,18 €
05669	AVDA. DIEGO DE MORON CON C/ NICARAGUA	ELIMINACION DE ISLETA EN CENTRO DE CALZADA	23/08/2016	23/08/2016	ROSA	111,00 €
05670	PLAZA DEL PERDON	ELIMINACION DE ALCORQUE SIN PLANTACION	23/08/2016	24/08/2016	ROSA	298,61 €
05671	C/ PADRE MARCHENA	REPARACION BALDOSAS DE GRANITO DE PASO REBAJADO	23/08/2016	30/08/2016	JENARO	313,58 €


05672	CIUDAD DEPORTIVA RECREATIVO DE HUELVA	ELIMINAR PINTADAS DE FACHADA	23/08/2016	26/08/2016	ROMAN	473,81 €
05673	GLORIETA DE LOS MARINEROS	SEÑALIZACION DE ESCALON EN ACERADO CON PINTURA ALTA VISIBILIDAD	24/08/2016	24/08/2016	ROMAN	62,24 €
05674	PLAZA DE LA MALAGUEÑA	RECOLOCACION DE PILONA MOD. TRAJANA Y REPARACION DE ACERADO	24/08/2016	24/08/2016	ROMAN	52,45 €
05675	PLAZA DE LA ALCAZABA	REPASO DE ACERADO ALREDEDOR Y EN EL INTERIOR DE PLAZA EN MAL ESTADO	24/08/2016		SEBASTIAN	361,40 €
05676	C/ ALOSNO	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	24/08/2016	25/08/2016	ROMAN	419,05 €
05677	AVDA. COSTA DE LA LUZ	RECOLOCACION DE PIEDRAS DE CORONACION DE MURO	24/08/2016	24/08/2016	ROSA	297,92 €
05678	CP. MANUEL SIUROT	REPARACION DE TECHO EN MAL ESTAD Y BALDOSAS EN PATIO RECREO	25/08/2016	31/08/2016	ROMAN	1.574,75 €
05679	C/ RUIZ DE ALARCON (ENTREDA COLEG. HISPNIIDAD)	REALIZACION DE RAMPA PARA MINUSVALIDO	25/08/2016	31/08/2016	JENARO	2.066,69 €
05680	C/ SAN JUAN	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	25/08/2016	25/08/2016	ROSA	100,01 €
05681	PLAZA HOUSTON	REPOSICION DE BALDOSA EN ACERADO	25/08/2016	25/08/2016	ROMAN	21,64 €
05682	C/ PUNTA UMBRIA	REPARACION DE ACERADO Y ESCALERA EN MAL ESTADO	25/08/2016	26/08/2016	ROMAN	390,03 €
05683	C/ JAZMIN	ANULAR ARQUETAS SIN SERVICIO	26/08/2016	26/08/2016	ROSA	212,69 €
05684	AVDA. JUAN NICOLAS MARQUEZ (PUERTA ORTOPEDIA)	ELIMAR RESTOS DE VIGAS DE VALLA PUBLICITARIA EN APARCAMIENTO	26/08/2016	26/08/2016	SEBASTIAN	23,40 €
05685	AVDA. FUERZAS ARMADAS (PALACIO DEPORTES)	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	26/08/2016	29/08/2016	ROMAN	484,92 €
05686	AVDA. SANTA MARTA (FRENTE TELEFONICA)	ANULAR HUECO DE CONTENEDORES Y REPASO DE ACERADO	26/08/2016	26/08/2016	ROSA	352,46 €
05687	AAVV. CRISTOBAL COLON	TRABAJOS DE PINTURA	26/08/2016	30/08/2016	ROMAN	279,71 €
05688	C/ CLARA CAMPOAMOR ESQ. C/ CAMARONES	ANULAR ALCORQUE SIN PLANTACION	29/08/2016	29/08/2016	ROSA	83,35 €
05689	PLAZA DE LA CANTIÑA Nº2	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	29/08/2016	29/08/2016	ROMAN	319,01 €
05691	C/ DOLORES IBARRURI	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	30/08/2016	30/08/2016	ROMAN	70,54 €

05692	PLAZA ACUARIO	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO EN TODA LA PLAZA	30/08/2016	30/08/2016	ROMAN	259,97 €
05693	PLACITA DE LA CRUZ	REALIZACION DE RAMPA PARA VEHICULOS DE EMERGENCIAS	30/08/2016		JENARO	641,62 €
05694	AVDA. SANTA MARTA (PLAZA AMAPRO CORREA)	REPASO DE ACERADO EN MAL ESTADO	31/08/2016	31/08/2016	ROSA	363,00 €
TOTAL EJECUTADO						66.459,69 €

Nº PARTES	INSPECTOR	IMPORTE	
7	JENARO GARRIDO (SECTOR ISLA CHICA-VIAPLANA)	19.352,74 €	29,12%
36	ROMAN REBOLLO (EDIFICIOS MUNICIPALES Y COLEGIOS PUBLICOS)	17.765,63 €	26,73%
16	ROSA FREITAS (SECTOR LA ORDEN - TORREJON)	18.438,16 €	27,74%
19	SEBASTIAN GOMEZ (SECTOR CENTRO)	10.903,16 €	16,41%
78		66.459,69 €	

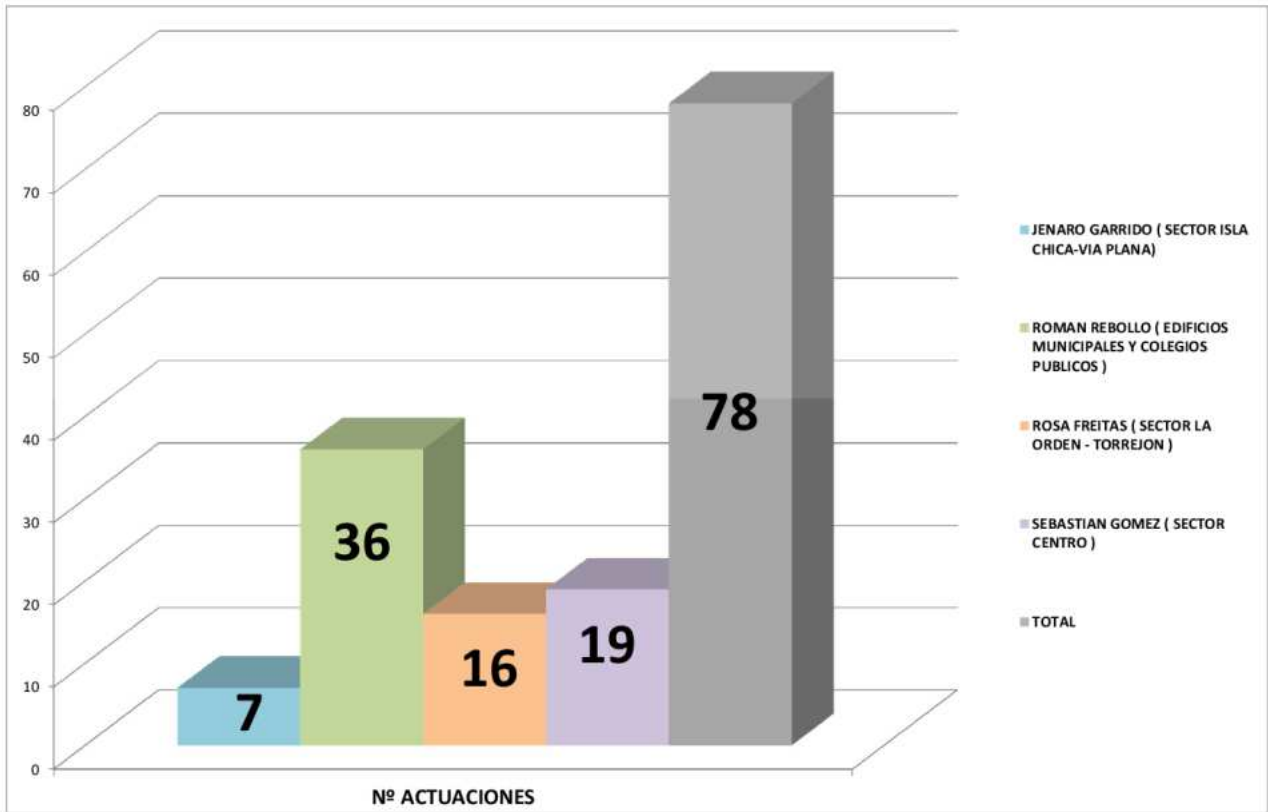

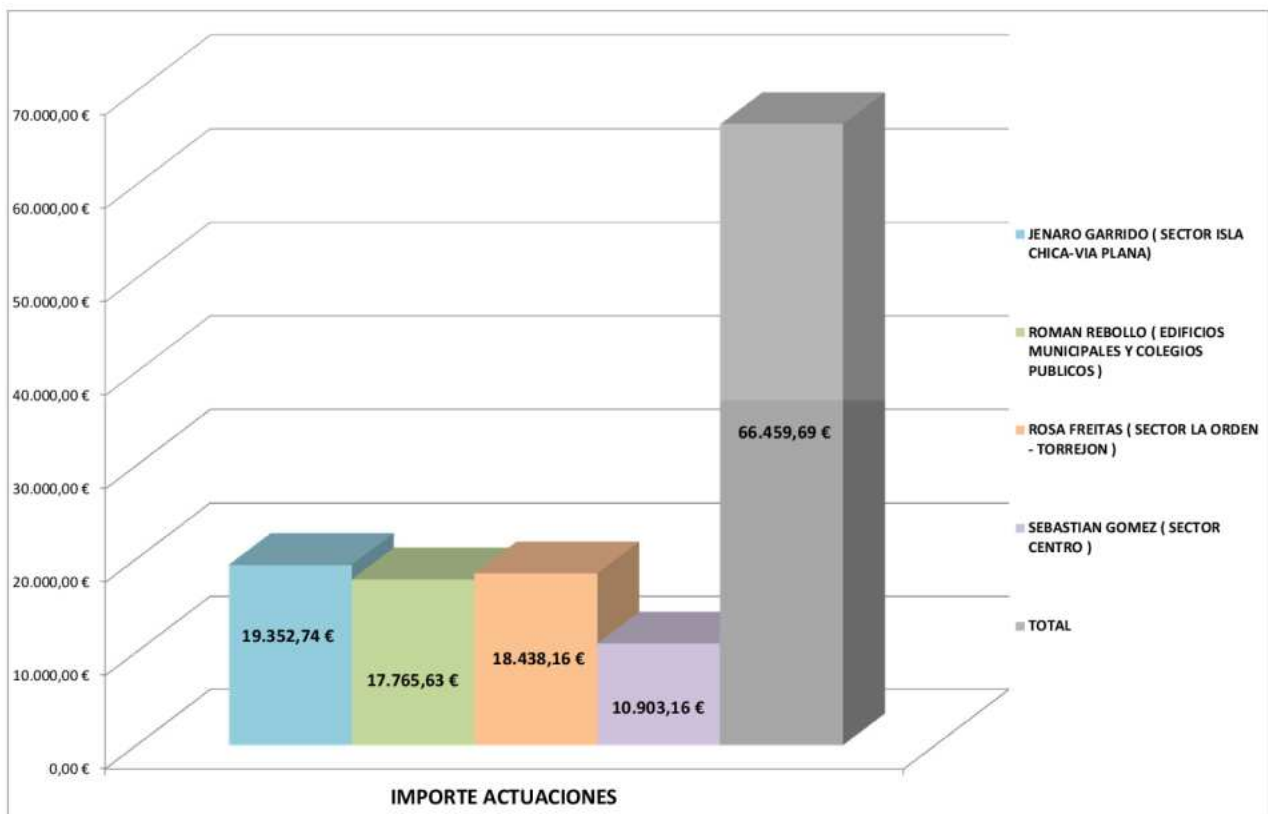

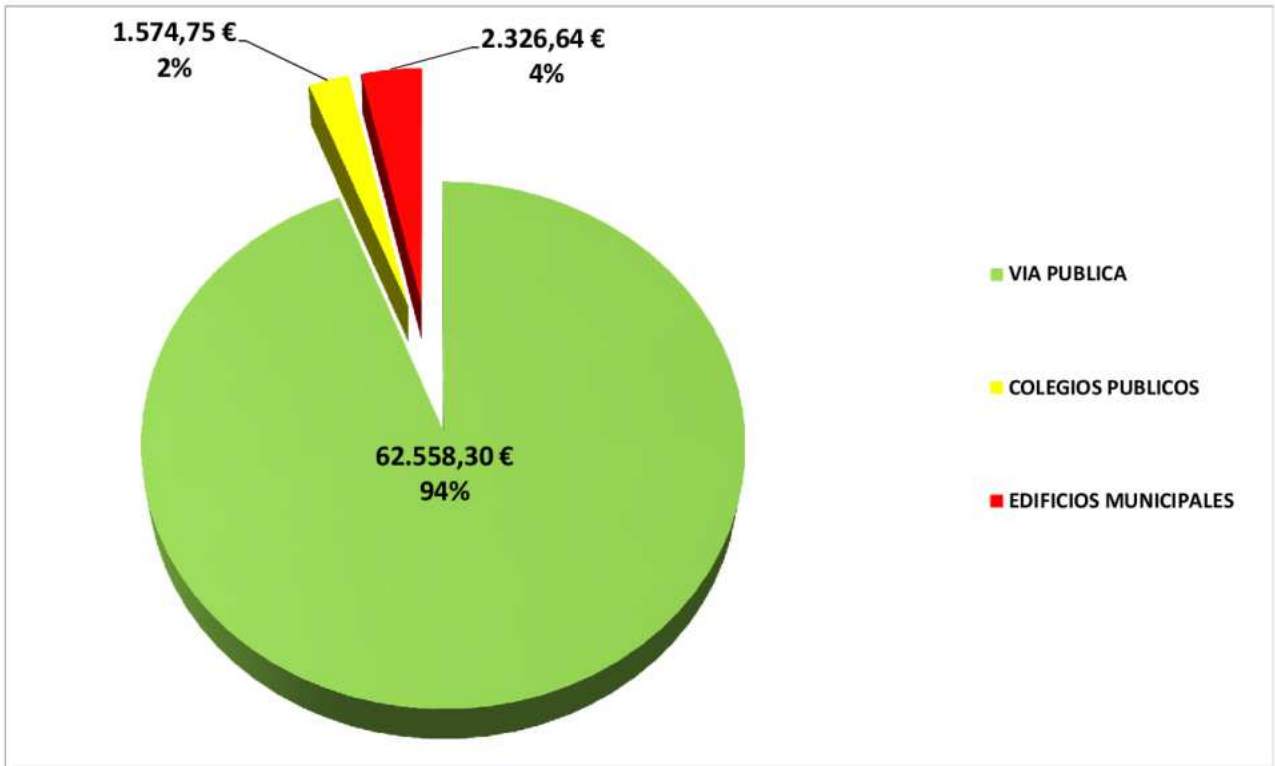

LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
AAVV. CRISTOBAL COLON	26-08-2016	30-08-2016
OFICIAL :	MIGUEL COLETE	INSPECTOR:
PEON:		ROMAN
COSTE OBRA:	279,71 €.	
DESCRIPCION:		
<p>- TRABAJOS DE PINTURA EN EL EXTERIOR DE LA ASOCIACION, TANTO PAREDES, COMO HERRAJES.</p>		



LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
ASFALTO	01-08-2016	26-08-2016
OFICIAL :	LUIS BAENA	INSPECTOR:
PEON:	TONI BREVA	ROSA
COSTE OBRA:	6.538,42 €.	
DESCRIPCION:		
- PARCHEOS CON ASFALTO EN FRIO, EN DIVERSAS CALLES DE HUELVA.		













LUIS BAENA / TONI BREVA :

- 01-08-2016:

C/ ALANIS DE LA SIERRA CON CAMINO EL SALADILLO (TERMINADO)

C/ ISLA CRISTINA CON AVDA. FEDERICO MOLINA (PASO PEATONES) (TERMINADO)

BRDA. MARISMAS DEL ODIEL (TERMINADO)

C/ CAMARONES (CANALIZACION) (TERMINADO)

LUIS BAENA / TONI BREVA :

- 02-08-2016:

AVDA. FEDERICO MOLINA (PUERTA PRINCIPAL HIPERCOR) (TERMINADO)

AVDA. DIEGO DE MORON CON AVDA. DE LA CINTA (TERMINADO)

C/ CAMARONES (ZONA APARCAMIENTOS) (TERMINADO)

AVDA. JULIO CARO BAROJA (ZONA DAMAS) (TERMINANDO)

C/ VALVERDE DEL CAMINO

LUIS BAENA / TONI BREVA :

- 03-08-2016:

C/ VALVERDE DEL CAMINO (TERMINADO)

AVDA. PABLO RUIZ PICASSO (DESDE CRUCE SALADILLO DIRECCION LA FLORIDA)

LUIS BAENA / TONI BREVA :

- 05-08-2016:

AVDA. DE LA ORDEN (PASO DE PEATON PARADA BUS) (TERMINADO)

POLIGONA LA PAZ (CARRETERA DE SERVICIO) (TERMINADO)

AVDA. ADORATRICES (JUNTO ZAPATERIA) (TERMINADO)

LUIS BAENA / TONI BREVA :

- 08-08-2016:

C/ ANTON DE ALAMINOS (JUNTO PUERTA GARAJE) (TERMINADO)

C/ ANTONIO JOSE MARTINEZ NAVARRO (TERMINADO)

C/ CERVANTES CON AVDA. NUEVO COLOMBINO (TERMINADO)

AVDA. PABLO RUIZ PICASSO (DESDE CRUCE SALADILLO DIRECCION LA FLORIDA)

LUIS BAENA / TONI BREVA :

- 09-08-2016:

C/ URUGAY (PASO REBAJADO) (TERMINADO)

AVDA. PABLO RUIZ PICASSO (APARCAMIENTOS JUNTO SUPERSOL) (TERMINADO)

LUIS BAENA / TONI BREVA :

- 10-08-2016:

C/ DAOIZ (CALZADA Y ZONA DE APARCAMIENTOS) (TERMINADO)

C/ ARAGON CON C/ LA PALMA (TERMINADO)

AVDA. CRISTOBAL COLON Nº1 (TERMINADO)

C/ CONDADO

LUIS BAENA / TONI BREVA :

- 11-08-2016:

PLAZA DE LA ALEGRIA CON AVDA. PALOMEQUE (TERMINADO)

C/ LIMA (TERMINADO)

C/ CONDADO (TERMINADO)

C/ HERMANO PALOMO (PASO REBAJADO Y ZONA CARGA Y DESCARGA) (TERMINADO)

LUIS BAENA / TONI BREVA :

- 12-08-2016:

AVDA. FEDERICO MOLINA CON C/ ISMAEL SERRANO (PASO REBAJADO) (TERMINADO)

C/ ISMAEL SERRANO CON AVDA. FEDERICO MOLINA (PASO REBAJADO) (TERMINADO)

AVDA. PABLO RUIZ PICASSO (DESDE CRUCE SALADILLO DIRECCION LA FLORIDA)

LUIS BAENA / TONI BREVA :

- 16-08-2016:

C/ HERMANOS OBRERO DE MARIA (TERMINADO)

AVDA. PABLO RUIZ PICASSO (DESDE CRUCE SALADILLO DIRECCION LA FLORIDA)

LUIS BAENA / TONI BREVA :

- 17-08-2016:

AVDA. GUATEMALA (HASTA C/ ECHEGARAY) (TERMINADO)

LUIS BAENA / TONI BREVA :

- 19-08-2016:

C/ CATALUÑA (TERMINADO)

AVDA. PABLO RUIZ PICASSO (DESDE CRUCE SALADILLO DIRECCION LA FLORIDA)

AVDA. PABLO RUIZ PICASSO (DIRECCION EL SALADILLO) (TERMINADO)

CAMINO DEL SALADILLO CON AVDA. PABLO RUIZ PICASSO (TERMINADO)

LUIS BAENA / TONI BREVA :

- 22-08-2016:

AVDA. CRISTOBAL COLON (TERMINADO)

LUIS BAENA / TONI BREVA :

- 23-08-2016:

C/ GONZALO DE BERCEO (TERMINADO)

C/ OBISPO DIAZ BERNAL (TERMINADO)

AVDA. HONDURAS (TERMINADO)

AVDA. PABLO RUIZ PICASSO (DESDE CRUCE SALADILLO DIRECCION LA FLORIDA)

LUIS BAENA / TONI BREVA :

- 24-08-2016:

C/ ISMAEL SERRANO (DESDE N°8 A AVDA. FEDERICO MOLINA)

LUIS BAENA / TONI BREVA :

- 25-08-2016:

C/ ISMAEL SERRANO (DESDE N°8 A AVDA. FEDERICO MOLINA) (TERMINADO)

CALLEJON SALIDA AMBULATORIO DE LA CINTA HACIA VIA PAISAJISTA (TERMINADO)

AVDA. PABLO RUIZ PICASSO (DESDE CRUCE SALADILLO DIRECCION LA FLORIDA)

LUIS BAENA / TONI BREVA :

- 26-08-2016:

C/ ARGANTONIO (TERMINADO)

AVDA. SANTA MARTA CON AVDA. DE LAS FLORES (TERMINADO)

AVDA. PABLO RUIZ PICASSO (DESDE CRUCE SALADILLO DIRECCION LA FLORIDA)

LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
AVDA. ALEMANIA Nº71	22-08-2016	25-08-2016
OFICIAL :	FERNANDO CALVO	INSPECTOR:
PEON:	ALEJANDRO FUENTES	SEBASTIAN
COSTE OBRA:	1.741,56 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REPARACION DE TRAMO DE ACERADO HUNDIDO, CON PENDIENTE HACIA FACHADA, PROVOCANDO HUMEDADES TANTO A VECINOS COMO A COMERCIO COLINDANTE.</p>	










LOCALIZACION:		FECHA INICIO:	FECHA FIN:
AVDA. DIEGO DE MORON CON C/ NICARAGUA		23-08-2016	23-08-2016
OFICIAL :	JOSE M ^a BASILIO	INSPECTOR:	
PEON:	JOSE M ^a VIDAL	ROSA	
COSTE OBRA:	111,00 €.		
DESCRIPCION:			
<p>- ELIMINACION DE ISLETA DE SEPARACION DE CARRIL CON EL HORMIGON LEVANTADO POR ACCIDENTE DETRAFICO, PARA SU POSTERIOR ASFALTADO.</p>			



LOCALIZACION:		FECHA INICIO:	FECHA FIN:
AVDA. FUERZAS ARMADAS		08-08-2016	29-08-2016
OFICIAL :	SERGIO ORTIZ	INSPECTOR:	
PEON:	DIEGO ROMERO	JENARO	
COSTE OBRA:	6.918,56 €.		
DESCRIPCION:			
<p>- NUEVA PAVIMENTACION DE TRAMO DE ACERADO DELANTE DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA, MUY TRANSITADO YA QUE AQUÍ SE ENCUENTRA LA PARADA DE BUS.</p>			






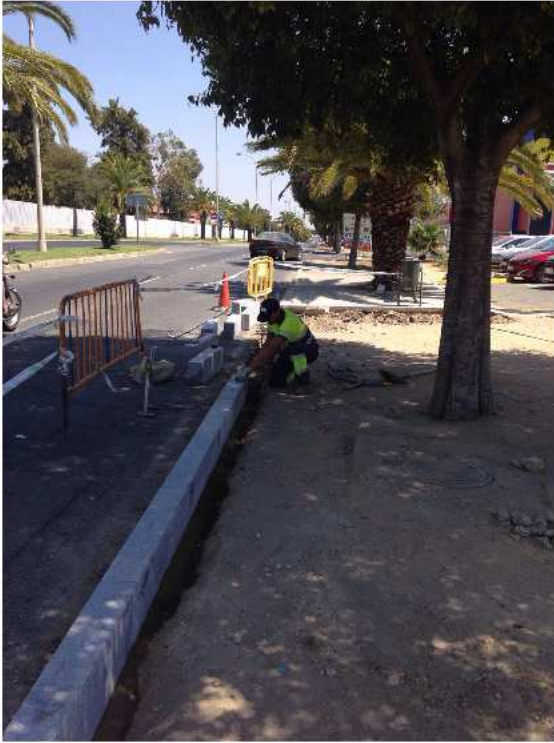






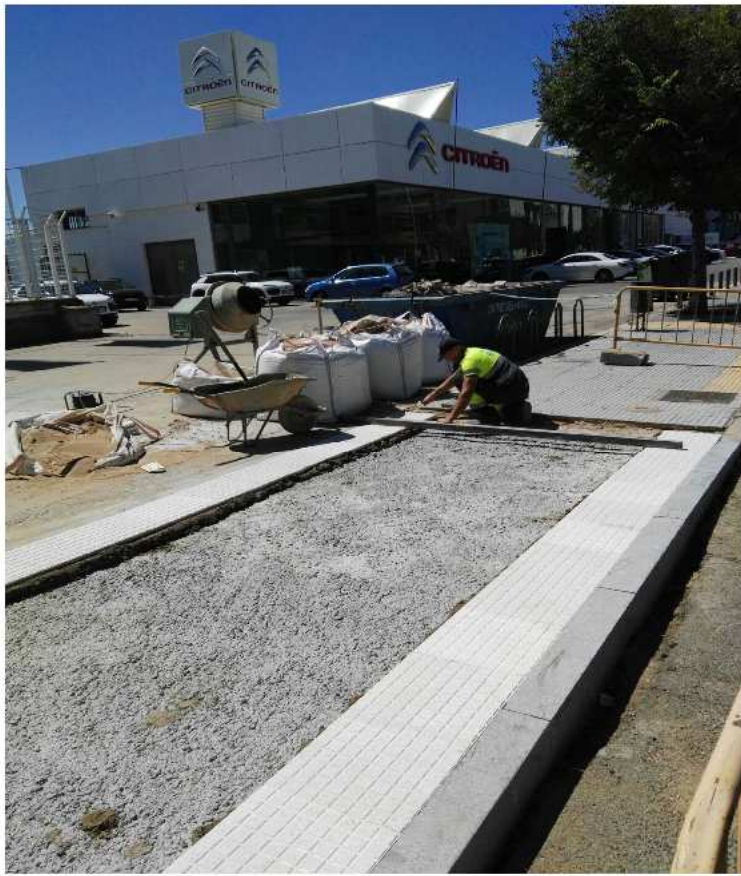



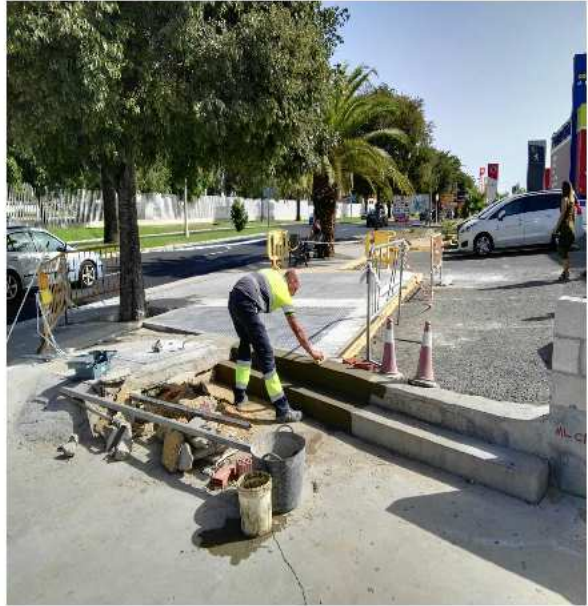



LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
AVDA. MANUEL SIUROT (MIRADOR CONQUERO)	16-08-2016	19-08-2016
OFICIAL :	FERNANDO CALVO	INSPECTOR:
PEON:	ALEJANDRO FUENTES	
COSTE OBRA:	1.534,58 €.	
DESCRIPCION:	<ul style="list-style-type: none"> - - CLAUSURAR EL MIRADOR SITUADO EN EL CONQUERO, DEBIDO A LA PELIGROSIDAD DEL TRANSITO DE PERSONAS POR ESTE. 	












LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
C/ ANTON DE ALMINOS	05-08-2016	05-08-2016
OFICIAL :	SERGIO ORTIZ	INSPECTOR:
PEON:	DIEGO ROMERO	SEBASTIAN
COSTE OBRA:	158,94 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REPARACION DE CALZADA EN MAL ESTADO, SE PRECEDE A SU DEMOLICION PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LA BASE DE LA CALZADA Y ACERADO, QUE ESTA PROVOCANDO QUE SE AMBOS SE HUNDAN.</p>	

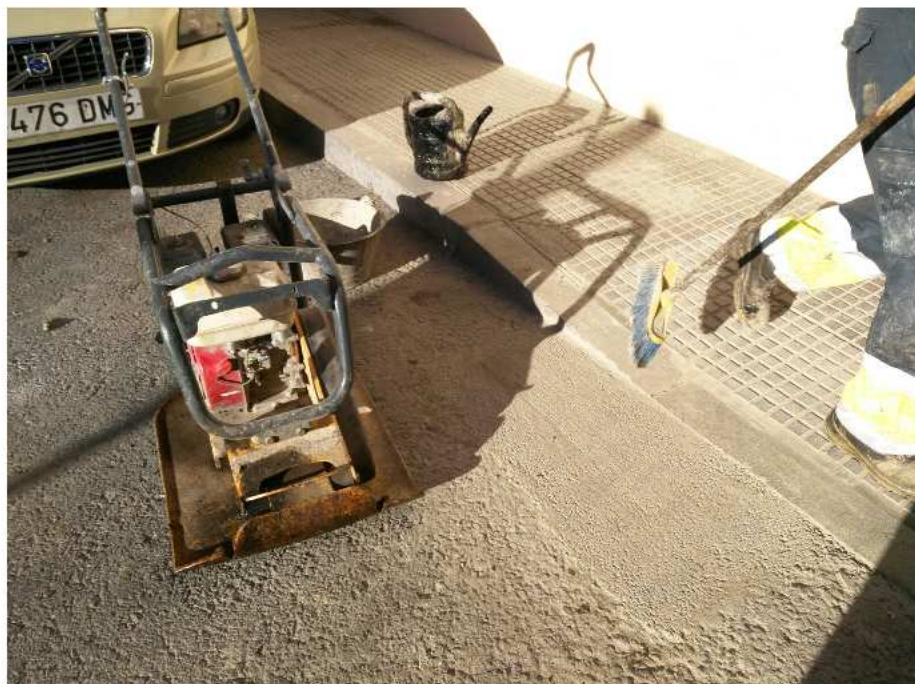



LOCALIZACION:		FECHA INICIO:	FECHA FIN:
C/ CAMARONES ESQ. C/ CLARA CAMPOAMOR		29-08-2016	29-08-2016
OFICIAL :	JOSE M ^a BASILIO	INSPECTOR:	
PEON:	JOSE M ^a VIDAL	ROSA	
COSTE OBRA:	83,55 €.		
DESCRIPCION:			
<p>- CEGAR ALCORQUE SIN PLANTACION, PELGROSO PARA LOS USUARIOS DE LA VIA.</p>			



LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
C/ DIEGO DE ALMAGRO	12-08-2016	25-08-2016
OFICIAL :	RAFAEL TOSCANO	INSPECTOR:
PEON:	RAFAEL MARTAGON	SEBASTIAN
COSTE OBRA:	2.802,04 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REPARACION DE JARDINERAS Y ACERADO EN MAL ESTADO POR LA ACCION DE LAS RAICES DE LOS ARBOLES.</p>	













LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
C/ FENICIOS Nº19	12-08-16	12-08-2016
OFICIAL :	FERNANDO CALVO	INSPECTOR:
PEON:	ALEJANDRO FUENTES	ROMAN
COSTE OBRA:	327,10 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REPARACION DE ACERADO EN MAL ESTADO, CON BALDOSAS SUELTAS Y ROTAS, PELIGROSAS PARA LOS USUARIOS DE LA VIA.</p>	





LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
C/ JABUGO N°8	01-08-2016	05-08-2016
OFICIAL :	SERGIO ORTIZ	INSPECTOR:
PEON:	DIEGO ROMERO	ROMAN
COSTE OBRA:	1.260,65 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REPARACION DE TRAMO DE ACERADO, JUNTO VIVIENDA, PROVOCANDOLE A ESTA HUMEDADES EN EL INTERIOR.</p>	







LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
C/ LENTISCO	11-08-2016	11-08-2016
OFICIAL :	FERNANDO CALVO	INSPECTOR:
PEON:	ALEJANDRO FUENTES	SEBASTIAN
COSTE OBRA:	100,88 €.	
DESCRIPCION:		
<p>- REPARACION DE ADQUINES SUELTOS EN VIA DE SERVICIO, JUNTO ARQUETA.</p>		



LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
C/ PUNTA UMBRIA	25-08-2016	26-08-2016
OFICIAL :	RAFAEL TOSCANO	INSPECTOR:
PEON:	RAFAEL MARTAGON	ROMAN
COSTE OBRA:	390,03 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REPARACION DE ACERADO Y ESCALERA EN MAL ESTADO, PRODUCIDO POR EL MOVIMIENTO DEL TERRENO, CON BALDOSAS Y BORDILLOS LEVANTADOS Y SUELTOS, PELIGROSO PARA LOS PEATONES.</p>	







LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
C/ RUBEN DARIO ESQ. C/ DIAZ DEL CASTILLO	26-07-2016	09-08-2016
OFICIAL :	LUIS GARRIDO	INSPECTOR:
PEON:	FERNANDO REDONDO	JENARO
COSTE OBRA:	4.351,41 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REALIZACION DE NUEVA PAVIMANTACION EN TRAMO DE ACERADO DE RUBEN DARIO EN MAL ESTADO</p>	























LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
C/ RUIZ DE ALARCON (ACERADO COLEGIO LA HISPANIDAD)	09-08-2016	12-08-2016
OFICIAL :		INSPECTOR:
PEON:	JOSE ATN. MURIEL	JENARO
COSTE OBRA:	2.224,54 €.	
DESCRIPCION:	<ul style="list-style-type: none"> - DEMOLICION DE TRAMO DE ACERADO EN MAL ESTADO, COLINDANTE CON EL COLEGIO; DE LA POSTERIOR CONSTRUCCION DE ESTE SE HACE CARGO EL COLEGIO. 	











LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
C/ RUIZ DE ALARCON	25-08-2016	31-08-2016
OFICIAL :	JOSE ANT. NUÑEZ	INSPECTOR:
PEON:	DAVID RIOS	JENARO
COSTE OBRA:	2.066,69 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REALIZACION DE RAMPA DE ACCESO A COLEGIO DESDE NUEVO ACERADO CONSTRUIDO POR EL ESTE.</p>	










LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
C/ TESORO DE ALISEDA	25-07-2016	01-08-2016
OFICIAL :	BENITO ROMERO	INSPECTOR:
PEON:	JOSE M ^a BASILIO	ROMAN
COSTE OBRA:	2.399,11 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REPARACION DE ENTRADA A GARAJE CON BALDOSAS EN MAL ESTADO, CON EL CONSIGUIENTE PELIGRO PARA LOS USUARIOS DE LA VIA DE TROPIEZOS Y CAIDAS.</p>	

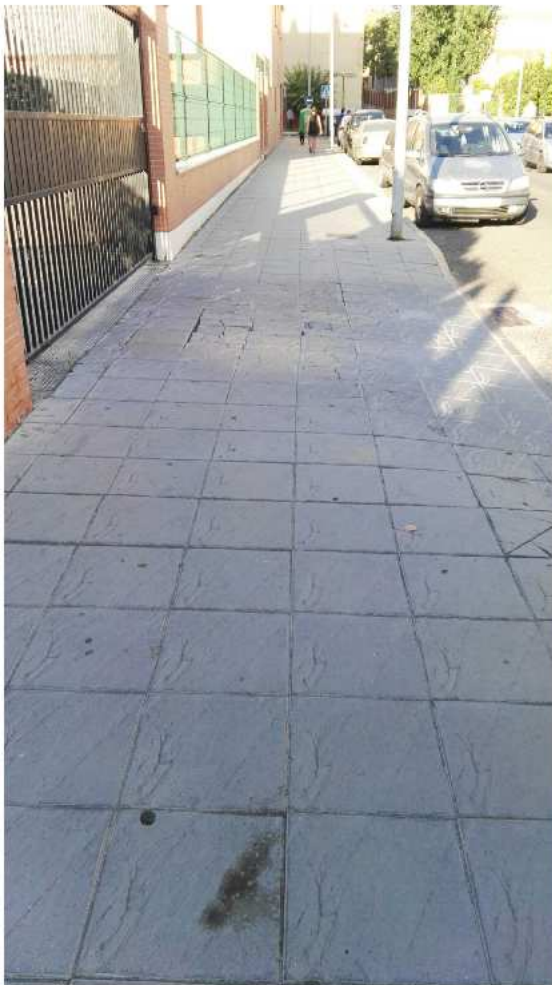










LOCALIZACION:		FECHA INICIO:	FECHA FIN:
CIUDAD DEPORTIVA RECREATIVO DE HUELVA		23-06-2016	26-06-2016
OFICIAL :	MIGUEL COLETE		INSPECTOR:
PEON:			ROMAN
COSTE OBRA:	743,81 €.		
DESCRIPCION:			
<p>- ELIMINACION DE PINTADAS EN FACHADA DE CIUDAD DEPORTIVA DEL RECREATIVO DE HUELVA.</p>			

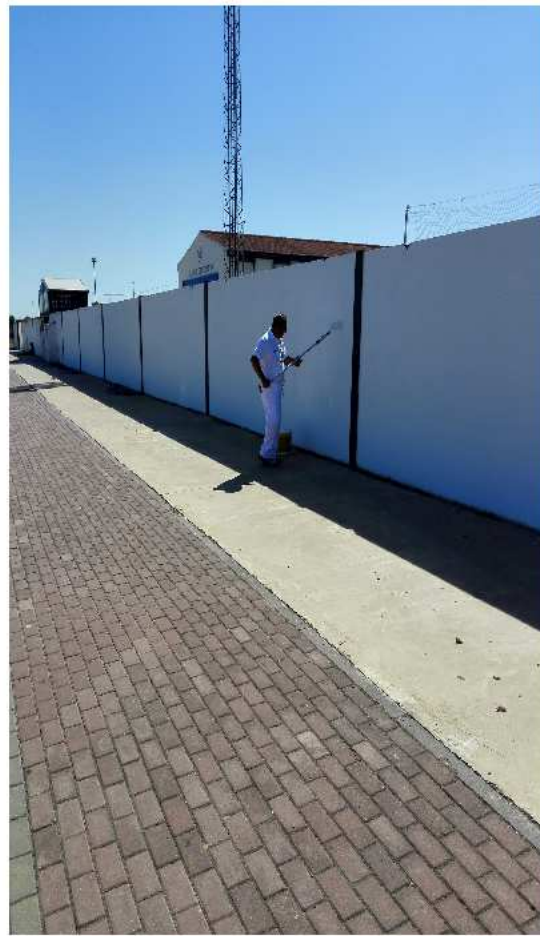





LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
PLAZA JORGE JUAN	01-08-2016	19-08-2016
OFICIAL :	JOSE ANT. NUÑEZ	INSPECTOR:
PEON:	DAVID RIOS	ROSA
COSTE OBRA:	4.589,07 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REPARACION DEL ACERADO DE LA PLAZA, EN MAL ESTADO POR LA RAICES DE LOS ARBOLES, Y DEMOLICION DE JARDINERA Y POSTERIOR RECONSTRUCCION.</p>	















LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
TRASERA C/ ARTESANOS	10-08-2016	18-08-2016
OFICIAL :	LUIS GARRIDO	INSPECTOR:
PEON:	FERNANDO RODRIGUEZ	ROSA
COSTE OBRA:	2.826,34 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REPARACION TRAMO DE CALZADA (VIA DE SERVICIO) COLINDANTE CON EL INSTITUTO DE LA ORDEN, EN MAL ESTADO POR LA ACCION DE LAS RAICES DE LOS ARBOLES.</p>	











LOCALIZACION:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
C/ CONDADO (TRASERA)	09-08-2016	09-08-2016
OFICIAL :	LUIS GARRIDO	INSPECTOR:
PEON:	FERNANDO RODRIGUEZ	SEBASTIAN
COSTE OBRA:	258,28 €.	
DESCRIPCION:	<p>- REPOSICION DE PILONAS DE TUBO AL FINAL DE LA CALLE, PARA EVITAR QUE LOS VEHICULOS TRANSITEN POR ENCIMA DEL ACERADO.</p>	

